Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov – Bohumín

Harmonogram postupu prací

ID	Název úkolu	Start	Konec
1	**Celková lhůta pro dokončení Díla - 31 měsíců**	12.03. 25	15.09. 27
2	**Sekce 1 Stavební + Sekce 2 - 28 měsíců**	12.03. 25	15.06. 27
3	**Lhůta pro dokončení Sekce 1 Stavební - 27 měsíců**	12.03. 25	15.05. 27
4	***Den zahájení stavebních prací***	12.03. 25	
5	přípravné práce	12.03. 25	16.03. 25
6	**Silniční část**	17.03. 25	23.12. 26
7	**SPS - K**	17.03. 25	23.04. 26
8	Etapa 0 - Zařízení staveniště	17.03. 25	23.03. 25
9	Etapa 1 - Přípravné práce pro výstavbu komunikací (na plochách AK a MSK, kácení, terénní úpravy, demolice haly, buněk), demolice budovy p. č. 1799, začátek prací na SO 01-19-02	24.03. 25	08.05. 25
10	Etapa 2 - Realizace prodloužení ul. Butovická (vč. zřízení inž. Sítí), pokračování prací na na SO 01-19-02	09.05. 25	23.12. 25
11	**Etapa 3**	24.09. 25	23.12. 25
12	Rekonstrukce stávající komunikace ul. Butovické	24.09. 25	23.12. 25
13	Realizace úpravy okružní křižovatky	10.12. 25	23.12. 25
14	Etapa 4 - Dokončovací práce	24.12. 25	23.04. 26
15	**SPS - S1**	24.04. 26	23.12. 26
16	Etapa 0 - Zařízení staveniště, kácení, přeložky IS, odstranění přejeudové konstrukce	24.04. 26	30.04. 26
17	Etapa 1 - Odstranění / rekonstrukce pravého jízdního pruhu + nová část ul. 2.května, přeložky ul. Mlýnské a ul. Vedoucí k	24.04. 26	23.08. 26
18	Etapa 2 - Odstranění / rekonstrukce levého jízdního pruhu ul. 2. května, rekonstrukce části ul. R. Tomáška	24.08. 26	23.10. 26
19	Etapa 3 - Realizace ul. Nádražní a vedlejší ul. Nádražní a komunikace podjezdu	24.09. 26	23.12. 26
20	**Železniční část**	08.08. 25	15.05. 27
21	**SPK - prodloužení ul. Butovická (likvidace přístřešku, oplocení a stavba nového**	08.08. 25	28.08. 25
22	**SP 0**	22.09. 25	10.03. 26
23	Příprava - Instalace provizoria TV	22.09. 25	16.10. 25
24	Příprava - Pažení u přejezdu	17.10. 25	24.10. 25
25	Příprava - Pažení mezi 1. a 2. TK	23.02. 26	28.02. 26
26	Přípravné práce (na plochách ZS, přeložkách sítí, úpravách TV), TV	01.01. 26	10.03. 26
27	Úpravy zab. zař. (výluky Z1+Z2+Z3+Z5)	01.03. 26	10.03. 26
28	Úpravy sděl. zař.	07.03. 26	10.03. 26
29	**SPD 3 - Práce na přejezdu P6770 - ZZ (výluka trať. Kol.)**	08.03. 26	06.04. 26
30	**SP 1**	10.03. 26	01.08. 26
31	Práce na liché kolejové skupině (výluka A) - jižní polovina mostu	10.03. 26	27.07. 26
32	* Úpravy TV a snášení železničního svršku	10.03. 26	14.03. 26
33	* Trakční výluka - krajní piloty (výluka C1)	24.03. 26	02.04. 26
34	* Úpravy TV a pokládka železničního svršku včetně podbití	23.07. 26	28.07. 26
35	* Úpravy zab. zař. (výluky Z6+Z7)	28.07. 26	01.08. 26
36	**SP 2**	01.08. 26	01.12. 26
37	Práce na sudé kolejové skupině (výluka B) - severní polovina mostu	02.08. 26	01.12. 26
38	* Úpravy TV a snášení železničního svršku	02.08. 26	06.08. 26
39	* Úpravy zab. Zař. (výluka Z4a)	01.08. 26	01.08. 26
40	* Trakční výluka - krajní piloty (výluka C2)	07.08. 26	16.08. 26
41	* Úpravy TV a pokládka železničního svršku včetně podbití	26.11. 26	30.11. 26
42	* Úpravy zab. zař. (výluka Z4b)	17.11. 26	17.11. 26
43	**SP 3 - Dokončovací práce**	02.12. 26	16.12. 26
44	Dokončení přejezdu a ul. Nádražní	17.12. 26	15.05. 27
45	***Dokončení stavebních prací - sekce 1 Stavební***		15.05. 27
46	Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	09.06. 27	15.06. 27
47	***Dokončení stavebních prací - sekce 2 Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje***		15.06. 27
48	Položky č. 1,2,3,4,5, a 7 SO 98-98	17.12. 26	15.06. 27
49	***Dokončení díla***		15.09. 27

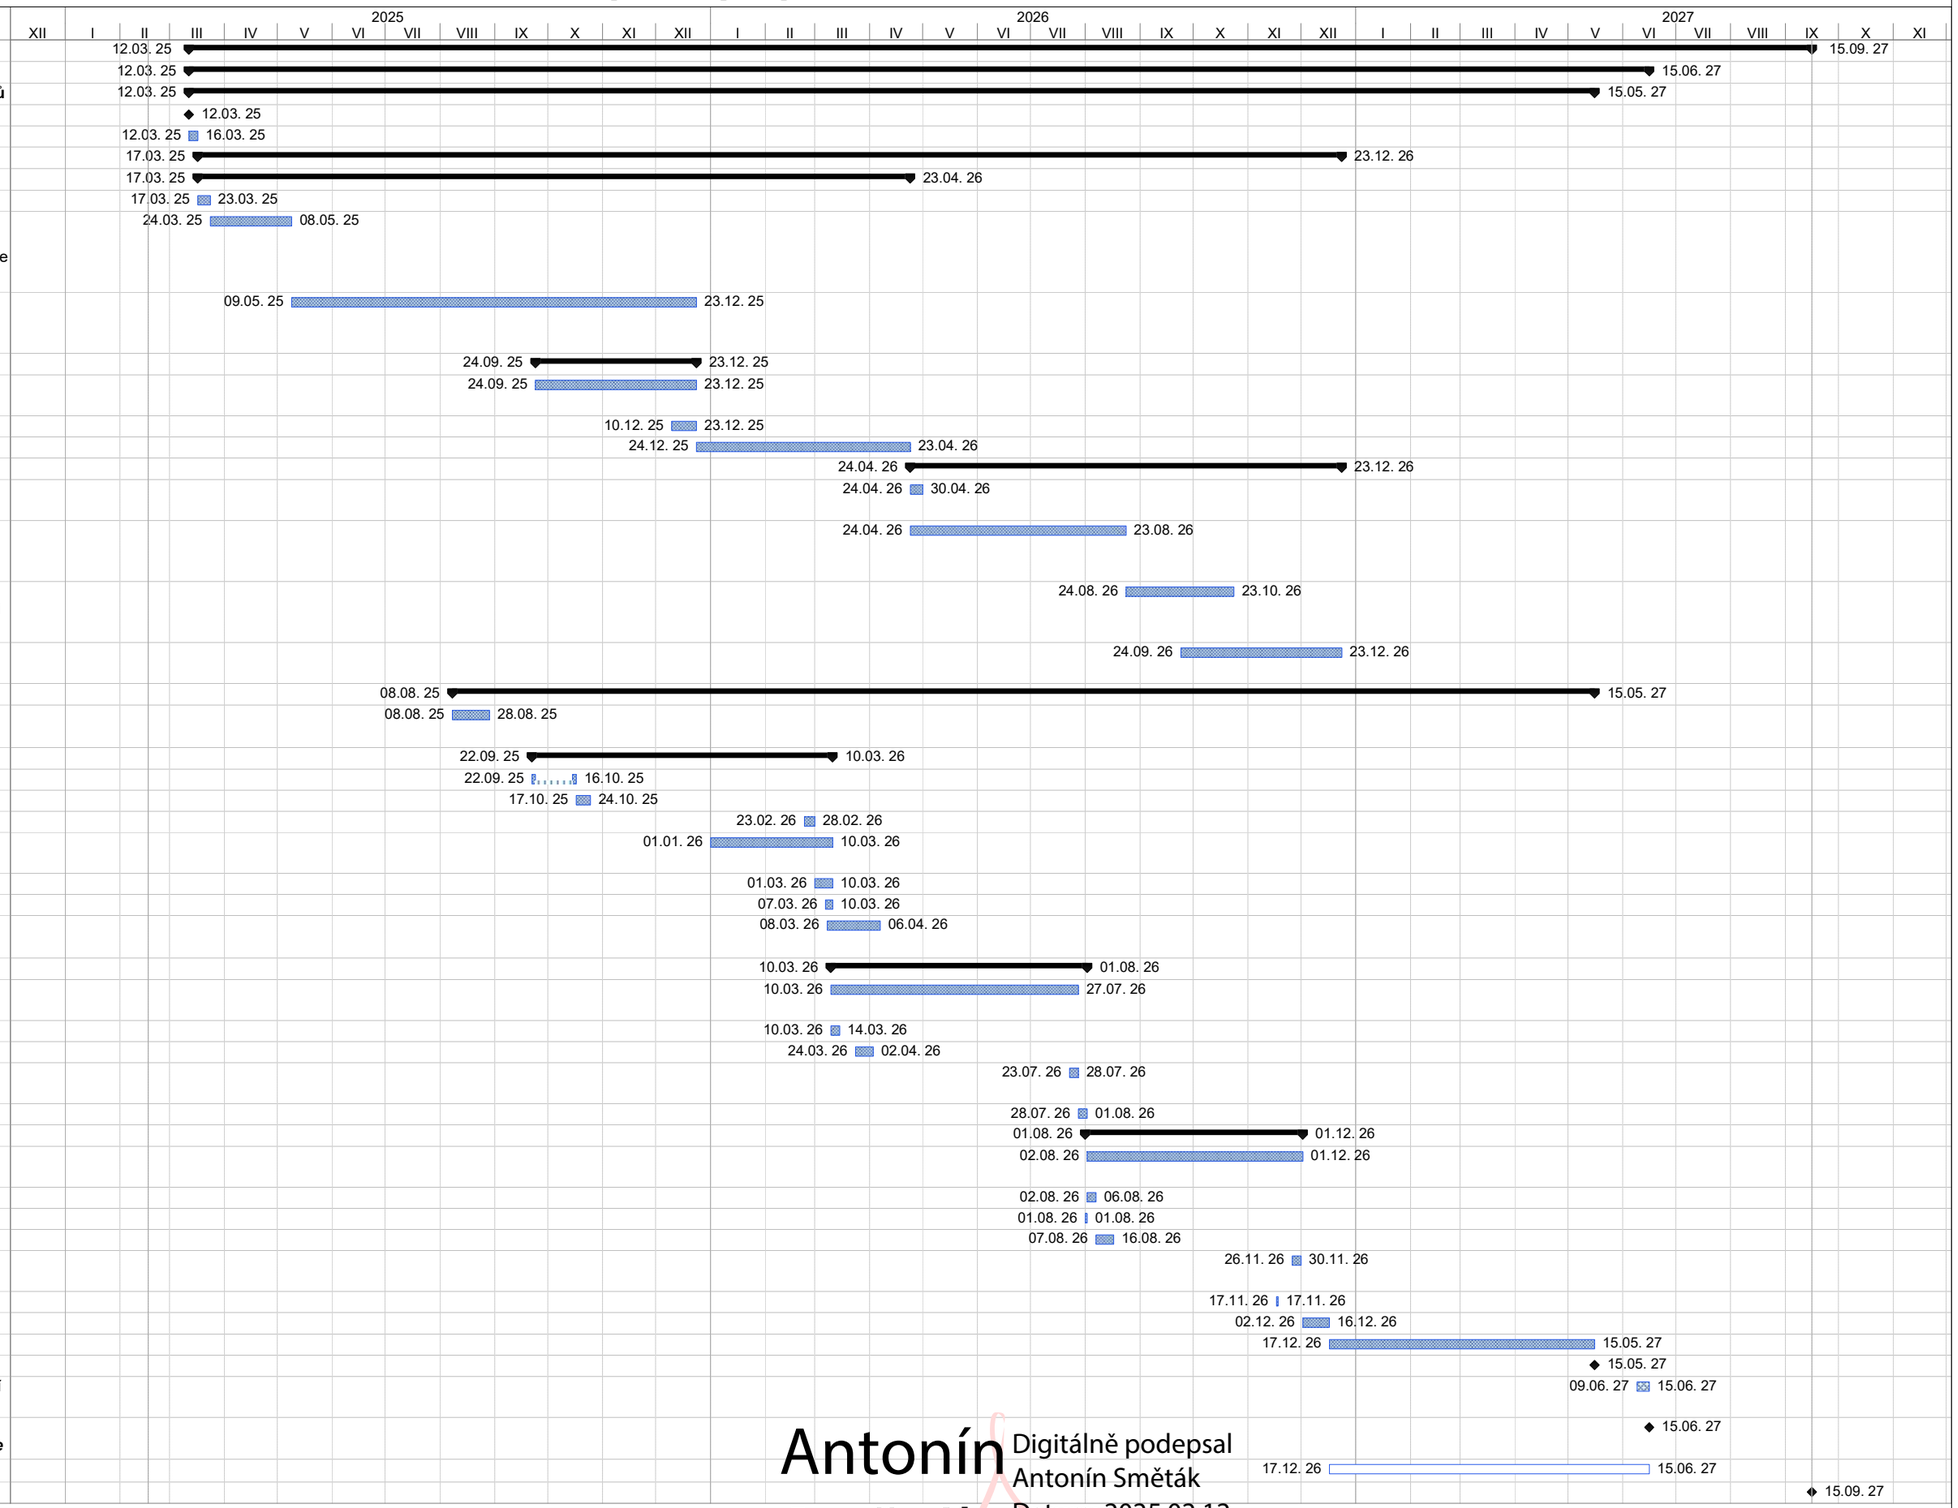

Datum: 12.02. 25

Úkol | Přerušení | Milník | Souhrnný

Antonín Směták

Digitálně podepsal Antonín Směták
Datum: 2025.02.12 13:33:05 +01'00'
